

Projektnetzplan nach DIN 69900 (Knotenvorgangsmodell CPM)

Projekt: IT-Ausstattung Planungsbuero VektorPlan GmbH | NextLevel IT Solutions | Dauer: 46 Arbeitstage

Legende DIN 69900 Vorgangsknoten


FAZ (Frueh. Start)	D (Dauer in Tagen)	FEZ (Frueh. Ende)
Vorgangs-Nr. & Name (Kritisch = Roter Rahmen)		
SAZ (Spaet. Start)	GP (Gesamtpuffer)	SEZ (Spaet. Ende)

- Kritischer Pfad (Puffer GP = 0, Verzoeigerung verschiebt Projektende)
- Nicht-kritischer Vorgang mit freiem Puffer (hier V10 Entsorgung, GP = 1 Tag)
- Kritische Abhaengigkeit / Anordnungsbeziehung (Normalfolge EA = 0)


PHASE 1: PROJEKTSTART, SPEZIFIKATION & KALKULATION (TAGE 0 - 19)



PHASE 2: BESCHAFFUNG, QUALITAETSPRUEFUNG & STAGING (TAGE 19 - 39)



PHASE 3: ROLLOUT, ENTSORGUNG & ABSCHLUSS (TAGE 39 - 46)

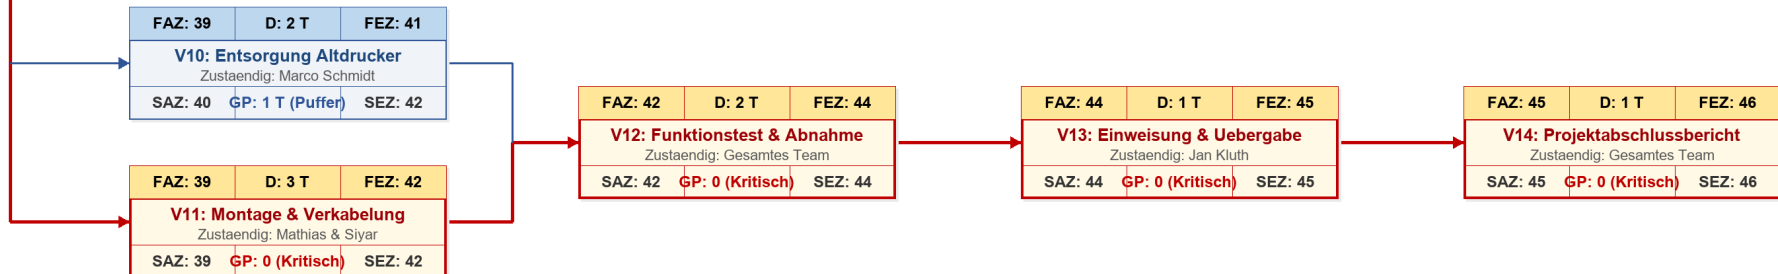

KRITISCHER PFAD (ROT): V1 -> V2 -> V3 -> V4 -> V5 -> V6 -> V7 -> V8 -> V9 -> V11 -> V12 -> V13 -> V14 | GESAMTDAUER: 46 ARBEITSTAGE | PUFFER V10: 1 TAG
